

INFORME DE AVANCE FÍSICO- FINANCIERO

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Financiamiento de Proyectos

Fecha de elaboración del informe		Trimestre que se informa (marque con X)			
31 de Diciembre de 2018		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic ☒
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto					
21 de Marzo de 2018					
Datos Generales					
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima			
Nombre del (la) Director (a) General o Apoderado (a) legal		LTS Marina Alfaro de Anda			
Domicilio		Encino # 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima			
Teléfono	Correo electrónico	Página Web			
312-31-63-100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/			

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la Atención a la Infancia en el DIF Colima

Objetivo del Proyecto
Fortalecer la atención integral y dar cumplimiento a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, a través de la intervención y mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las instalaciones en el Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y la Unidad de Servicios Infantiles (USI) a cargo del DIF Estatal Colima, en materia de seguridad, protección civil, esparcimiento y calidad en el servicio, con el fin de realizar mejoras para beneficiar el bienestar y calidad de vida de las y los menores que se encuentren en cualquiera de estos dos establecimientos.

3

[Handwritten signature]

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

1. 28 de Septiembre de 2018 se firma convenio modificatorio adicional SEIDUR-DIF-CM-003/2018 para la obra remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima; dicho convenio no modifica las obras o acciones comprometidas, ni el monto autorizado, ni los tiempos de ejecución del proyecto
2. 11 de Octubre de 2018 se realizó la Reinauguración y puesta en marcha del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima.
3. 11 de Octubre de 2018 se realizó la Reinauguración y reapertura al público de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima.
4. Se firma contrato SEIDUR-DIF-003/2018 para concluir acciones comprometidas en el proyecto; obras de remodelación y modernización del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas

Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta conforme a lo Programado	Documento Verificatorio	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
4.1 Concluir las obras y acciones en el Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y de la Unidad de Servicios Infantiles.	100%	SEIDUR-DIF-CM-003/2018 Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero Informe final de resultados Relación de gastos Acta de entrega Estimaciones Contrato SEIDUR-DIF-003/2018	28 de Septiembre de 2018 se firma convenio modificatorio adicional SEIDUR-DIF-CM-003/2018 para concluir las acciones comprometidas en el proyecto de la obra remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima; dicho convenio no modifica las obras o acciones comprometidas, ni el monto autorizado, ni los tiempos de ejecución del proyecto. El día 11 de Octubre de 2018 se realizaron las reinauguraciones y puesta en marcha del Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo Soler y la Unidad de Servicios Infantiles del DIF Estatal Colima. Se firma contrato SEIDUR-DIF-003/2018 para concluir acciones comprometidas en el proyecto; obras de remodelación y modernización del Centro de Asistencia Social "Francisco Gabilondo Soler" del DIF Estatal Colima; dicho contrato no modifica las obras o acciones comprometidas, ni el monto autorizado, ni los tiempos de ejecución del proyecto.

3

Reporte de avances en población beneficiada

Actualmente los espacios se encuentran abiertos, beneficiando directamente a 927 Niñas, Niños y Adolescentes de 758 que se tenían contemplados en el proyecto, aprovechando la seguridad e integridad de los espacios remodelados y rehabilitados; se anexa padrón de beneficiarios.

Información de los Recursos Financieros Otorgados

Descripción de Obras y/o Acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 3 Cine teatro USI Acabados Talleres USI Preliminares Albañilería Ludoteca USI Aluminio Gimnasio USI Preliminares Est. Metálica Albañilería Herrería Exterior USI Preliminares Acabados Aluminio Herrería Construcción de Rampa #2, #3 y #5	\$ 1,932,098.03	\$ 217,823.66	1030	La factura corresponde a la estimación 3 destinado al Cine teatro, Talleres, Ludoteca, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.

3



Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 4 Ludoteca USI Aluminio Lactantes USI Herrería Gimnasio USI Est.. Metálica Acabados Inst. Hidráulica y Sanitaria Exterior USI Preliminares Albañilería Acabados Inst. Hidráulica y Sanitaria Malla Ciclón	\$ 1,932,098.03	\$ 176,789.49	1031	La factura corresponde a la estimación 4 destinado a la Ludoteca, Lactantes, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 1 A Cine teatro USI Preliminares Albañilería Aire Acondicionado Talleres USI Preliminares Albañilería Lactantes USI Herrería Gimnasio USI Preliminares Est. Metálica Albañilería Acabados Inst. Hidráulica y Sanitaria Herrería Exterior USI Acabados Inst. Hidráulica y Sanitaria Herrería Construcción de Rampa #1, #2, #3 y #5	\$ 1,932,098.03	\$ 117,085.31	1033	La factura corresponde a la estimación 1 A destinado al Cine Teatro, Talleres, Lactantes, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.

3

Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 1 B Cine teatro USI Preliminares Acabados Aluminio Aire Acondicionado Ludoteca USI Preliminares Acabados Gimnasio USI Preliminares Est. Metálica Albañilería Acabados Aluminio Herrería Aparatos Exterior USI Preliminares Herrería	\$ 1,932,098.03	\$ 263,772.68	1036	La factura corresponde a la estimación 1 B destinado al Cine Teatro, Ludoteca, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 5 Gimnasio USI Acabados Exterior USI Inst. Hidráulico	\$ 1,932,098.03	\$ 7,756.85	1050	La factura corresponde a la estimación 5 destinado al Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.

3

Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 2 A Gimnasio USI Albañilería Exterior USI Acabados Inst. Hidráulico	\$ 1,932,098.03	\$ 21,436.07	1051	La factura corresponde a la estimación 2 A destinado al Cine Teatro, Ludoteca, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles.
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 2 B Gimnasio USI Aparatos	\$ 1,932,098.03	\$ 2,627.52	1052	La factura corresponde a la estimación 2 B destinado al Gimnasio de la Unidad de Servicios Infantiles.
Remodelación y modernización de la Unidad de Servicios Infantiles Estimación 1 CM Cine teatro USI Acabados Herrería Gimnasio USI Est. Metálica Exterior USI Preliminares Albañilería Acabados	\$ 1,932,098.03	\$ 113,712.43	1064	La factura corresponde a la estimación 1 CM destinado al Cine Teatro, Gimnasio y Exterior de la Unidad de Servicios Infantiles
Total	\$ 1,932,098.03	\$921,004.02		

7

Remodelación y modernización del CAS Francisco Gabilondo Soler Edificio D Edificio Dormitorio y Escolar Niños Preliminares Albañilería Instalación Eléctrica Acabados Instalación Hidráulica y Sanitaria Aluminio Herrería Área Exterior Preliminares Albañilería	\$4,057,901.99	\$ 349,283.89	3.3 Folio 17	La factura corresponde al pago de la estimación 1, que incluye el Edificio "D" Dormitorio y Escolar Niños y el Área Exterior
Edificio "A" Administrativo Preliminares Voz y Datos Edificio "C" Dormitorio Preliminares Albañilería Acabados Herrería Aluminio Instalación Eléctrica Instalación Hidráulica y Sanitaria	\$4,057,901.99	\$ 238,798.60	3.3 Folio 20	La factura corresponde al pago de la estimación 2, que incluye el Edificio "A" Administrativo y Edificio "C" Dormitorio.

3

Edificio "A" Administrativo Preliminares Edificio "C" Dormitorio Preliminares Albañilería Acabados Aluminio Instalación Eléctrica	\$4,057,901.99	\$ 3,681.23	3.3 Folio 24	La factura corresponde al pago de la estimación 2-A, que incluye el Edificio "A" Administrativo y Edificio "C" Dormitorio.
Edificio "D" Edificio y Dormitorio Escolar Niños Acabados Área Exterior Preliminares Albañilería	\$4,057,901.99	\$ 20,301.73	3.3 Folio 26	La factura corresponde al pago de la estimación 1-A, que incluye el Edificio "D", Dormitorio y Escolar Niños y Área Exterior

3



Edificio "A" Administrativo Albañilería Acabados Herrería Aluminio Instalación Eléctrica Edificio "B" Lavandería Preliminares Albañilería Acabados Aluminio Instalación Eléctrica Instalación Hidráulica y Sanitaria Edificio "C" Dormitorio Albañilería Instalación Eléctrica Instalación de Gas Edificio "D" Albañilería Acabados Aluminio Instalación Eléctrica Edificio Dormitorio y Escolar Niñas Preliminares Albañilería Instalación Eléctrica Acabados Aluminio Herrería Edificio Comedor Preliminares Albañilería Acabados Aluminio Instalación Eléctrica	\$4,057,901.99	\$ 818,390.58	3.3 Folio 28	La factura corresponde al pago de la estimación 3, que incluye el Edificio "A" Administrativo, Edificio "B" Lavandería, Edificio "C" Dormitorio, Edificio "D", Edificio Dormitorio y Escolar Niñas, Edificio Comedor y Área Exterior.
Área Exterior Preliminares Albañilería Acabados Herrería Instalación Eléctrica Instalación Hidráulica y Sanitaria				

3

Edificio "A" Administrativo				
Aluminio				
Instalación Eléctrica				
Edificio "B" Lavandería				
Preliminares				
Albañilería				
Acabados				
Aluminio				
Instalación Eléctrica				
Instalación Hidráulica y Sanitaria				
Edificio "C" Dormitorio	\$4,057,901.99	\$ 91,364.94	3.3 Folio 30	
Aluminio				
Instalación Eléctrica				
Edificio "D"				
Acabados				
Aluminio				
Instalación Eléctrica				
Edificio Dormitorio y Escolar Niñas				
Instalación Eléctrica				
Aluminio				
Edificio Comedor				
Preliminares				
Albañilería				
Acabados				
Aluminio				
Instalación Eléctrica				
Área Exterior				
Preliminares				
Albañilería				

La factura corresponde al pago de la estimación 3-A, la cual incluye Edificio "A" Administrativo, Edificio "B" Lavandería, Edificio "C" Dormitorio, Edificio "D", Edificio Dormitorio y Escolar Niñas, Edificio Comedor y Área Exterior.

3

Edificio "A" Administrativo Acabados Instalación Hidráulica y Sanitaria Edificio "B" Lavandería Acabados Herrería Aluminio Instalación Eléctrica Edificio "C" Dormitorio Acabados Edificio "D" Preliminares Herrería Instalación Hidráulica y Sanitaria Edificio Dormitorio y Escolar Niños Instalación Eléctrica Acabados Edificio Dormitorio y Escolar Niñas Acabados Instalación Hidráulica y Sanitaria Edificio Comedor Herrería Aluminio Instalación Eléctrica Instalación Hidráulica y Sanitaria Área Exterior Acabados Herrería Instalación Eléctrica Instalación Hidráulica y Sanitaria	\$4,057,901.99	\$ 731,079.08	3.3 Folio 32	La factura corresponde al pago de la estimación 4, la cual incluye Edificio "A" Administrativo, Edificio "B" Lavandería, Edificio "C" Dormitorio, Edificio "D", Edificio Dormitorio y Escolar Niños, Edificio Dormitorio y Escolar Niñas Edificio Comedor y Área Exterior.
Área Exterior Pararrayos	\$4,057,901.99	\$ 169,660.83	3.3 Folio 33	La factura corresponde al pago de la estimación 5, la cual corresponde al Área Exterior.


3

Área Exterior Preliminares Albañilería Herrería	\$4,057,901.99	\$ 533,132.28	208	La factura corresponde al pago de la estimación 1, la cual corresponde al Área Exterior.
Área Exterior Aluminio Instalación Hidráulica y Sanitaria	\$4,057,901.99	\$ 62,292.56	209	La factura corresponde al pago de la estimación 2, la cual corresponde al Área Exterior.
Total	\$4,057,901.99	\$3,017,985.71		
Contraloría Social Trípticos, Lonas Informativas y Artículos Promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas	\$9,999.98	\$941.92	B 3204	La factura corresponde al pago de la Contraloría Social
Contraloría Social Trípticos, Lonas Informativas y Artículos Promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas	\$9,999.98	\$2,018.40	4937	La factura corresponde al pago de la Contraloría Social
Contraloría Social Trípticos, Lonas Informativas y Artículos Promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas	\$9,999.98	\$7,040.04	1152	La factura corresponde al pago de la Contraloría Social
Contraloría Social	\$9,999.98	\$10,000.36		
Total	\$6,000,000.00	\$3,948,790.09		

3




Informe Gráfico de Avances

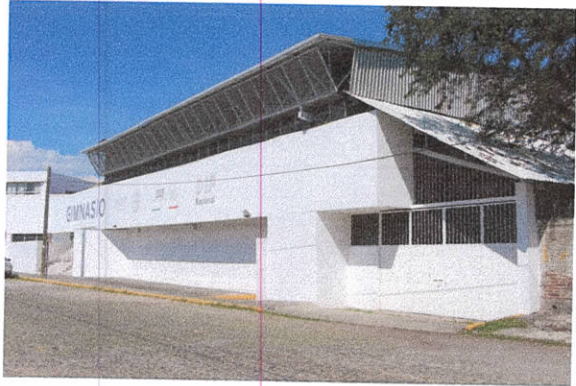

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Se cumplieron todas las metas planteadas en el proyecto ejecutivo.


L.T.S MARINA ALFARO DE ANDA.
DIRECTORA GENERAL DEL SEDIF COLIMA
