



TRANSFERENCIA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INTEGRADOS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA EN MATERIA DE SUS ACCIONES
DE INTERVENCIÓN RELATIVAS A LA NIÑEZ MIGRANTE. EJERCICIO 2022

INFORME TRIMESTRAL

Fecha de radicación del recurso	Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa
22 de marzo de 2022	12 de Octubre de 2022	Julio a Septiembre del 2022

Datos Generales	
Nombre de la Institución Ejecutora	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.
Nombre del Director (a) General, Coordinador(a) General o su similar	Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio.
Domicilio laboral	Encino No. 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima.
Teléfono	Correo electrónico
(312) 316 3100 Ext. 3109 y 3110	difestatal.dirgen@gmail.com

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Estado de Colima.
Nombre completo del CAS	Albergue temporal para niñas, niños y adolescentes migrantes
Domicilio (tipo y nombre de vialidad, número exterior, número interior, código postal, tipo y nombre de asentamiento)	Calle: Veracruz # 1560, Colonia: Moctezuma, Colima, México, C.P. 28048
Municipio y entidad federativa	Colima, Colima.

Objetivo del Proyecto
Proporcionar atención para niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, se encuentren en situación de migración y en el cual, se les brinde cuidado alternativo y/o acogimiento integral, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Periodo de atención de NNA atendidos	NA
Número de NNA atendidos (anexar tabla de población atendida por día,	Durante este periodo de reporte no se atendió a NNA, ya que nos encontramos en la etapa de habilitación el espacio con la obra, adquisición de productos del albergue y recepción y



al mes)	entrevistas del personal para la operación del mismo.
Perfil de atención:	Niñas, niños y adolescentes no acompañados. Niñas, niños y adolescentes acompañados.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Instrucciones: Realice una descripción detallada de las etapas de desarrollo del proyecto hasta el punto en el que se encuentra, destacando su congruencia con los objetivos y metas del mismo, así como los indicadores que expresen el impacto, avances y resultados a la presentación del informe que corresponda (primero, segundo, tercero o cuarto).

Durante este periodo de **julio a septiembre del 2022**, se firmó convenio con SEIDUM, se contrató al proveedor para la habilitación de la obra del espacio, se realizó el comité para las adquisiciones de insumos para el equipamiento del albergue; así como el reclutamiento del personal para la operación del mismo.

1. Acciones de infraestructura y/o fortalecimiento de la misma en CAS y/o Establecimientos Asistenciales:

Se realizó durante el periodo informado la firma de convenio de colaboración para la contratación y ejecución de la obra "Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Estado de Colima, con la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Colima (SEIDUM) por la cantidad de **\$ 1,455,000.00 (un millón, cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos M.N.)**, celebrado el día 11 de julio del año en curso.

Una vez firmado el convenio, la SEIDUM elaboró el proyecto ejecutivo en coordinación con el personal técnico del DIF Estatal, compuesto por el catálogo de conceptos, estudio de mercado, presupuesto base, programa de obra y proyecto con especificaciones técnicas de las acciones, también se realizó el procedimiento para licitar, dictaminar y adjudicar la contratación del proyecto, siendo este proceso los días del 02 al 09 de agosto del 2022.

Una vez realizado el proceso de contratación, se llevó a cabo la firma de **contrato de la obra SEIDUM-DIF-001/2022**, el día 16 de agosto del presente año y sus respectivas fianzas de anticipo con el proveedor ganador.

Se iniciaron los trabajos de rehabilitación de la obra del proyecto el día 17 de agosto, en relación a: Retiro de enjarres en fachada, muros interiores y exteriores, dormitorios, pasillos, aplanados y conexiones eléctricas, registros, retiro de azulejo; así como entortados e impermeabilización en azotea y pintura en muros y mantenimiento de malla ciclónica.

Se le realizó el pago del anticipo al contratista de la obra por la





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

cantidad de \$ 373,832.32 (trescientos setenta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos 32/100 M.N.).

También se empezó con la instalación de sistema de video vigilancia del albergue.

Se llevó a cabo la sesión del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios por parte el DIF Estatal, para la apertura de propuestas relativas al **procedimiento de invitación restringida identificada como IA-906022993-E2-2022**, para la adquisición de literas y electrodomésticos para el proyecto de migrantes; el cual estaba programado para el 21 de septiembre, pero por cuestiones del Sismo del 19 de septiembre ocurrido en el Estado, se vio la necesidad de reprogramarlo para el día 03 de octubre del presente año. El día 06 de octubre, se sesiono el comité para dar lectura del dictamen técnico y notificación del fallo al proceso de adquisición para el equipamiento el albergue de migrantes de NNA.

Donde se adquirieron los siguientes productos: estufa múltiple, refrigerador, centro de lavado y secado por la cantidad de \$124,262.68 (ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y dos pesos 68/100M.N.).

Y por adjudicación directa: adquisición e instalación del sistema video-vigilancia, tanque de gas estacionario por la cantidad de \$ 44,785.68 (cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 68/100 M.N.).

2. Adquisición de productos de primera necesidad:

Por adjudicación directa se adquirió los siguientes productos: almohadas de descanso económica, toallas y cobijas por la cantidad de \$ 30,856.00 (treinta mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).

3. Gastos de operación para el fortalecimiento del modelo de atención y cuidados de las Personas Migrantes (niñas, niños y adolescentes):

Se empezó con el proceso de reclutamiento del personal para la operación del albergue, donde se realizó la recepción de currículos y documentación y entrevistas de las personas.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO.

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
En esta sección se deben incluir las metas que se plantearon en el proyecto.	En este punto se debe indicar el progreso estimado en porcentaje del avance de las metas.	La serie de actividades, medidas, acciones según corresponda que se han realizado con el fin de lograr las metas con base a su avance y cronograma.





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

2.-Espacio rehabilitado, reacondicionado y equipado que recibirá a NNA migrantes.	100%	Firma de convenio. Proceso de contratación y contrato con proveedores.
	40%	Bitácora de seguimiento de la obra. Adquisición de productos para el equipamiento del albergue
3.-Servicios proporcionados de atención, cuidados y/o acogimiento residencial temporal de calidad e integral a Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración.	30%	Recepción de currículos y documentación y entrevistas de las personas para atención y operación del albergue.

Reporte de avance en actividades por metas					Porcentaje de avance	Evidencia o justificación de avance
Número de meta	Actividad	Indique el porcentaje de avance por mes				
		julio	agosto	septiembre		
2	Firma de convenio	100			100	Convenio firmado
	Proceso de contratación y contrato con proveedores.		100		100	Contrato y fianza firmado para la obra
	Seguimiento de obra			40	40	Bitácoras de seguimiento
	Equipamiento del albergue			40	40	Acta de comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y facturas de compras directas
3	Servicios proporcionados de atención, cuidados y/o acogimiento residencial temporal de calidad			30	30	Expediente con currículos y documentación de las personas para la atención y



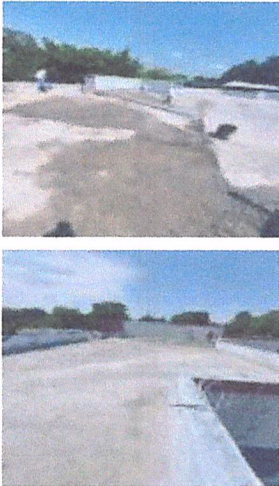


COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

	e integral a Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de migración.					operación del albergue
--	--	--	--	--	--	------------------------

TERCERA PARTE. AVANCE GRÁFICO.

Informe Gráfico de Avances			
Fotografías que permitan observar los avances alcanzados en el trimestre que se reporta. Las imágenes deberán ser capturadas de diferentes ángulos. No podrán ser tomadas de internet o de folletos. El tamaño de las fotos anexadas deberán ser no menores a 5 x 5 cm y no mayores de 10 x 10 cm. Deberá anexar al menos dos fotografías de cada meta, señalando el número de la meta y describiendo la fotografía (indicar la fecha en la que se capturó la imagen), antes y después de la ejecución del proyecto.			
Meta	Imagen		Descripción
	Antes	Después	
2			Impermeabilización del techo
2			Rehabilitación de Malla ciclónica





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

2			Retiro de azulejo
2	 	 	Registros
2	 		Enjarres y aplanados





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

2	   	Instalación eléctrica
2	 	Instalación del sistema de video vigilancia
2	  	Pintura





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

			Enjarres y aplanados
			Enjarres y aplanados





COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

CUARTA PARTE. JUSTIFICACIÓN.

Observaciones

En caso de tener un retraso o incumplimiento de la(s) meta(s) deberá justificar y argumentar la(s) razón(es) adjuntando las evidencias correspondientes.

Se tiene un retraso de las acciones, por motivo del Sismo ocurrido el día 19 de septiembre del 2022 en el Estado de Colima, lo cual provoco que las actividades tanto laborales como operativas y administrativas se suspendieran por 2 semanas, debido a que se estaba trabajando en restablecer los sistemas de la institución, así como la entrega de los dictámenes por parte de protección civil como espacios seguros para seguir operando.

Donde la fecha compromiso de apertura del espacio sería para el 01 de noviembre 2022.

ELABORO

BERTHA ISABEL CRUZ LOPEZ
COORDINADORA DE CALIDAD Y PLANEACION



SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE COLIMA

VALIDO

RAFAEL CONTRERAS OCHOA
DIRECTOR DE ASISTENCIA JURIDICA
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION VIII, DEL ARTICULO 75 DE LA LEY
DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, Y
EL ARTICULO 80 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 5 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente, de acuerdo con el calendario proporcionado por el SNDIF para tales fines.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Población atendida (cantidad por día)

Mes:

Día	Niña menor a 6 años	Niño menor a 6 años	Niña de 6 a 11 años 11 mese	Niño de 6 a 11 años 11 mese	Mujer adolescente	Hombre adolescente	Acompañante
1	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

