

Anexo 13

INFORME DE AVANCE FISICO- FINANCIERO

Unidad de Atención a Población Vulnerable
Programa de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Apoyo a Proyectos

Fecha de elaboración del informe		Trimestre que se informa (marque con X)			
5 de Octubre de 2017		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
				X	
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto					
22 de Mayo de 2017					
Datos Generales					
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima			
Nombre del Director General ó Apoderado legal		Dra. En C. Mayrén Polanco Gaytán			
Domicilio		Encino # 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima			
Teléfono	Correo electrónico	Página Web			
3123163100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/			
Nombre del Proyecto					
Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes y de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima					
Objetivo del Proyecto					
Aumentar la calidad y espacios de infraestructura en la atención especializada de las y los adolescentes en el Estado, mediante la construcción de dos Módulos dentro del predio dedicado a la Casa de las y los Adolescentes en el terreno donde se albergaba la Eco-Granja DIF dentro de una superficie de 185,314.2 m². Así como continuar con la Construcción de nuevas áreas del Quirófano de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima apegadas a las normas sanitarias y aumentar la capacidad de atención de las personas en estado de vulnerabilidad y sin seguridad social.					

uypt

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

- 8 de Agosto de 2017 se inicia contrato de construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal con código de contrato 1544713.
- Comienza el proceso de Licitación Pública con número LO-906004999-E59-2017, para la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 7 de Septiembre de 2017 se realiza la visita de instalaciones, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 8 de Septiembre de 2017 se realizó el Acta de junta de Aclaraciones, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 14 de Septiembre de 2017 se realizó el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 21 de Septiembre se emite un Diferimiento para el fallo de la licitación para el día miércoles 27 de septiembre de 2017, referente a la obra Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, Villa de Álvarez, Colima.
- 27 de Septiembre se emite el Fallo relativo a la licitación pública LO-906004999-E59-2017.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas

Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
2.1. Iniciar los trabajos preliminares y construcción dentro del predio de la Eco-Granja DIF para iniciar la construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los Adolescentes.	30%	• Mediante las licitaciones previas, se realizó el fallo para otorgar el proyecto a la constructora con mejor oferta de trabajo, se empezaran las obras.
2.2. Iniciar los trabajos preliminares y construcción de acuerdo a las nuevas normas sanitarias vigentes para las áreas de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	• Se terminó en tiempo los trabajos preliminares en la construcción de acuerdo a las normas establecidas.
2.3. Elaborar el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero y enviar a instancia normativa.	100%	• Se realizó el informe en tiempo y forma.


WJPD

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias ALBAÑILERIA COMPLEMENTO ACABADOS COMPLEMENTO HERRERIA Y CANCELERIA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA COMPLEMENTO INSTALACION ELECTRICA COMPLEMENTO MEDIA TENSION GASES MEDICINALES VOZ Y DATOS CCTV	1,478,309.95	443,026.30	65	La factura corresponde al pago del 30% como anticipo a la obra y a la aportación con los recursos federalizados del Sistema Nacional DIF. En las facturas siguientes resultantes de dicha obra, se emitirán facturas como proceso de estimaciones de la misma las cuales se desglosarán los montos por partida.
Total	1,478,309.95	443,026.30		

WYPS .

Informe Gráfico de Avances

Proceso de los trabajos de Construcción de Espacios de la de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.

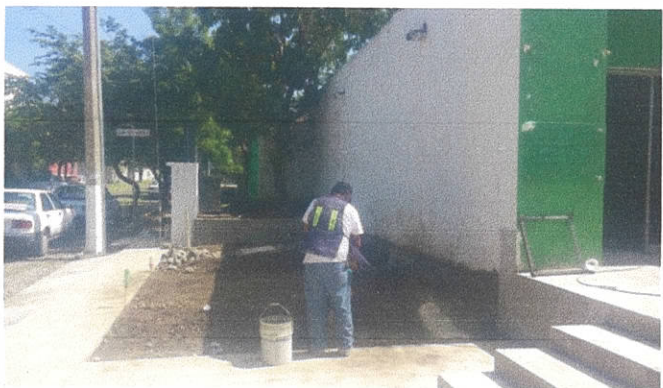

wpb.



TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

De acuerdo a las metas establecidas en el Anexo 9 del presente proyecto, en lo sucesivo a la meta 2.1 establecida para el tercer trimestre para el inicio de obra de la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes, se completará y aplicará el 100% de dicha meta para el último trimestre; a causa de la programación y término de la licitación pública del proyecto con número LO-906004999-E59-2017 (se anexa documentación de la Licitación, la cual también puede ser consultada en el portal CompraNet, <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html>).



DIRECTORA GENERAL DEL SEDIF COLIMA

DRA. EN C. MAYREN POLANCO GAYTAN

Nombre y firma del Director General /Apoderado Legal
