

Anexo 13

INFORME DE AVANCE FISICO- FINANCIERO

Programa de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Financiamiento de Proyectos

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marcar con X)			
31 de diciembre del 2017	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
22 de Mayo de 2017				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima	
Nombre del Director General o Apoderado legal	Lic. Marina Alfaro de Anda	
Domicilio	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(01) 312 3163 100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/

Nombre del Proyecto
Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes y de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima

Objetivo del Proyecto

Aumentar la calidad y espacios de infraestructura en la atención especializada de las y los adolescentes en el Estado, mediante la construcción de dos Módulos dentro del predio dedicado a la Casa de las y los Adolescentes en el terreno donde se albergaba la Eco-Granja DIF dentro de una superficie de 185,314.2 m². Así como continuar con la Construcción de nuevas áreas del Quirófano de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima apegadas a las normas sanitarias y aumentar la capacidad de atención de las personas en estado de vulnerabilidad y sin seguridad social.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

- 07 Octubre de 2017, se iniciaron los trabajos de construcción dentro del predio de la Eco-Granja DIF para iniciar la construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los Adolescentes.
- 31 Octubre de 2017, se realizó el Comité de Contraloría Social para la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 07 de Diciembre de 2017, se realizaron los primeros recursos ejercidos para la construcción de nuevos espacios de la Casa de las y los Adolescentes.
- 15 de Noviembre de 2017, se concluyeron los trabajos para la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 31 de Diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos para lograr aumentar 30 por ciento la capacidad de atención de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 12 Diciembre de 2017, se realizó el Comité de Contraloría Social para la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes en el predio de la Eco-Granja DIF.
- 31 Diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos para la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes.
- 31 de Diciembre de 2017, se concluyeron los trabajos para lograr aumentar 10 por ciento la cobertura de la población atendida en espacios comunitarios destinados al desarrollo de capacidades, ampliar el acceso y conocimiento para el fortalecimiento del tejido social.
- 31 de Diciembre de 2017, se beneficiaron 718 personas con la Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes y 79 personas con la Construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.
- 31 de Diciembre de 2017, se elaboró el tiempo y forma el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero para envío a instancia normativa.
- 31 de Diciembre de 2017, se elaboró el tiempo y forma el Informe Final de Resultados para envío a instancia normativa.
- 31 de Diciembre de 2017, se elaboró el expediente técnico de comprobación del proyecto para envío a instancia normativa.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
3.1. Conformar los Comités de la Contraloría Social.	100%	Se realizaron los comités de Contralorías Social en tiempo y forma, respecto a la obra de Casa de las y los Adolescentes se efectuó el día 12 de diciembre del presente año, y sobre la Unidad de Cirugías Ambulatorias tuvo lugar el día de noviembre del mismo año.
3.2. Afianzar la vinculación interinstitucional para la operatividad de programas en la Casa de las y los Adolescentes (Convenios firmados actualmente: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (CONALEP), Universidad Vizcaya de las Américas en Colima y la Universidad Multiétnica Profesional Colima para la prestación de servicios; la Secretaría de la Juventud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social).	100%	Se afianzaron formas de organización con los programas activos del DIF Estatal Colima y acuerdos previamente establecidos para beneficio de las y los Adolescentes a través de la ejecución del presente proyecto.
3.3. Concluir la obra de la Casa de las y los Adolescentes.	100%	Se terminó en tiempo los trabajos para la conclusión de los trabajos y construcción de la Casa de las y los Adolescentes en el predio de la Eco-Granja DIF.
3.4. Concluir la obra de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	Se terminó en tiempo los trabajos para la conclusión de la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias de acuerdo a las normas establecidas.
3.5. Aumentar en 10 por ciento la cobertura de la población atendida en espacios comunitarios destinados al desarrollo de capacidades, ampliar el acceso y conocimiento para el fortalecimiento	100%	Con la correcta ejecución y construcción del proyecto de construcción de la Casa de las y los Adolescentes, se cumplió la meta de aumento en 10 por ciento de los espacios comunitarios para el desarrollo de capacidad, ampliar el acceso y conocimiento para el fortalecimiento del tejido social.

del tejido social.		
3.6. Aumentar en 30 por ciento la capacidad de atención de la Unidad de Cirugías Ambulatorias.	100%	Con la correcta conclusión de la construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias, se aumentó en 30 por ciento la capacidad de atención y oferta en los servicios hacia la población en situación vulnerable.
3.7. Elaborar el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero y enviar a instancia normativa.	100%	El presente documento cumple el procedimiento administrativo, el cual se elaboró en tiempo y forma para su envío a la instancia normativa, la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF.
3.8. Elaborar el Informe Final de Resultados y Relación de Gastos y enviar a instancia normativa.	100%	Se elaboró el Informe Final de Resultado y la Relación de gastos en tiempo y forma para su envío a la instancia normativa, la Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF.
3.9. Comprobar el proyecto, acorde a los requerimientos de las Reglas de Operación del Programa y enviar a instancia normativa.	100%	Se elaboró el Expediente técnico acorde a las Reglas de Operación del Programa, para envío a la Unidad de Asistencia e Integración Social y la Dirección General de Rehabilitación para realizar al 100 por ciento dicha meta.

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	1,331,487.50	B125	Anticipo del 30% de la Obra: Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes en villa de Álvarez
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	159,692.04	B127	Pago de Estimación 2 de la Obra: Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes en villa de Álvarez
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	178,273.71	B126	Pago de Estimación 1 de la Obra: Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes en villa de Álvarez

Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	409,160.74	B129	Pago de Estimación 3 de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	533,855.69	B132	Pago de Estimación 4 de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	854,249.81	B134	Pago de Estimación 5 de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	665.82	B128	Pago de Estimación 1 A de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	15,838.33	B131	Pago de Estimación 2A de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez Construcción
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	13,591.75	B133	Pago de Estimación 3A de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez Construcción
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	414,534.91	B136	Pago de Estimación 3A de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez Construcción
Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes	5,001,690.05	138,178.30	B137	Pago de Estimación 3A de la Obra: Construcción de espacios de la Casa delas y los Adolescentes en villa de Álvarez Construcción


Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes		5,001,690.05	857,301.83	B135	Pago de Estimación 3A de la Obra: Construcción de espacios de la Casa de las y los Adolescentes en villa de Álvarez Construcción
Construcción de la unidad de cirugías ambulatorias		\$1,478,309.95	200,845.66	87	Pago de Estimación no. 2 para Construcción de la unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima
Construcción de la unidad de cirugías ambulatorias		\$1,478,309.95	78,907.52	89	Pago de Estimación no. 2A para Construcción de la unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima
Construcción de la unidad de cirugías ambulatorias		\$1,478,309.95	103,019.22	93	Pago de Estimación no. 3 para Construcción de la unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima
Construcción de la unidad de cirugías ambulatorias		\$1,478,309.95	50,875.81	96	Pago de Estimación no. 2A para Construcción de la unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima
CONTRALORIA SOCIAL (Promoción y difusión de Contraloría Social del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad. Trípticos y artículos promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas). Incluye actividades en las obras y acciones del proyecto.		\$20,000.00	16,820.00	890	Compra de 250pz de lápiz color rojo, 250pz bolígrafo slm color blanco con tapa roja, 250 pz regla traslucida y 250 pz cilindro de plástico transparentes

CONTRALORIA SOCIAL (Promoción y difusión de Contraloría Social del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad. Trípticos y artículos promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas). Incluye actividades en las obras y acciones del proyecto.	\$20,000.00	3,180.00	F1317	Compra de 250pz de lápiz color rojo, 250pz bolígrafo slm color blanco con tapa roja, 250 pz regla traslucida y 250 pz cilindro
Total	\$6,500,000.00	\$5,343,658.64		



Informe Gráfico de Avances

Proceso de Construcción de Espacios de la Casa de las y los Adolescentes

Antes

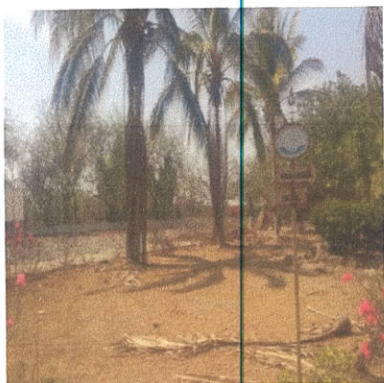


Después

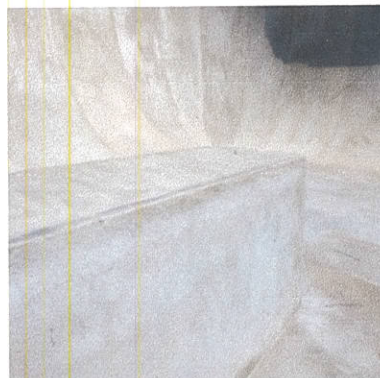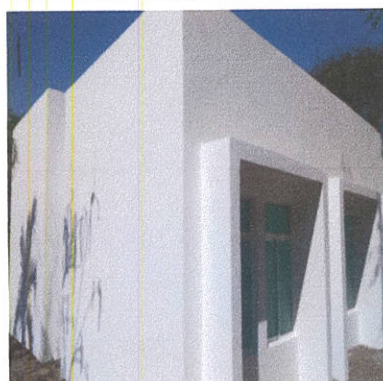



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Proceso de Construcción de la Unidad de Cirugías Ambulatorias

Antes

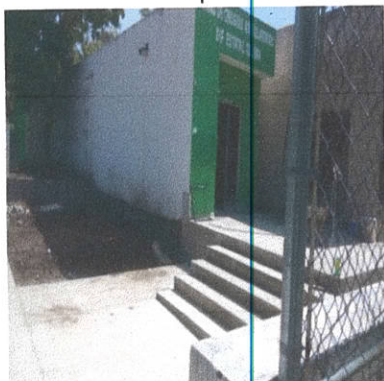

Después

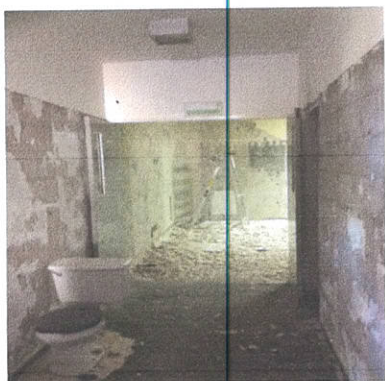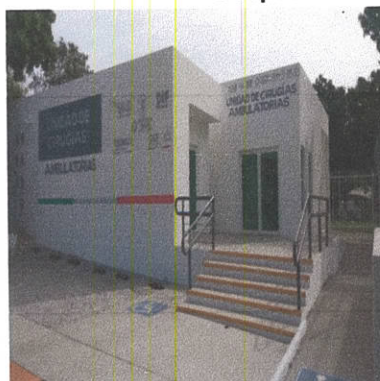

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones
Se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto, para la atención y beneficio de la población en situación vulnerable.



Lic. Marina Alfaro de Anda
Directora General del SEDIF Colima
