

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marcar con X)			
31 de diciembre del 2017	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
19 de Mayo 2017				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima	
Nombre del Director General o Apoderado legal	Lic. Marina Alfaro de Anda	
Domicilio	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(01) 312 3163 100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/

Nombre del Proyecto
Adquisición e Instalación de Un Tanque Hidroterapéutico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Estatal Colima

Objetivo del Proyecto

Contribuir a mejorar la calidad y bienestar de vida de las personas con discapacidad y generar espacios nuevos, adecuados y habilitados dentro del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal Colima, mediante la adquisición e instalación de un tanque hidroterapéutico donde se beneficiará, principalmente, a personas en el estado de Colima identificadas con algún tipo de discapacidad; con el fin de coadyuvar a la autosuficiencia, desarrollo e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad en el Estado y promover que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se realizaron los trámites administrativos para efectuar pagos y liberar recursos presupuestarios referentes al proyecto.

Se realizaron supervisiones en el CREE Colima, dentro del área de intervención para brindar seguimiento al proyecto.

Se concluyó con la ejecución del proyecto y se beneficiaron 589 personas con discapacidad.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas

Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
• Elaborar el Proyecto y presentar a la Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS) del SNDIF para su valoración y aprobación.	100%	Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Integración Social, así como en la Dirección General de Rehabilitación, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación para la aprobación del proyecto, elaboración del convenio y la radicación de los recursos federales.
• Firmar el convenio de Colaboración con instancia normativa y el DIF Estatal de Colima.	100%	
• Apertura de una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del Programa.	100%	
• Realizar al procedimiento administrativo para adquirir e instalar	100%	Se realizaron los procedimientos para la Licitación Pública Nacional con Número LA-906022993-E1-2017


el tanque hidroterapéutico (licitación).		
Realizar las actividades de la Contraloría Social (conformar los Comités de la Contraloría Social pertinentes, colocar los letreros de Contraloría Social con la totalidad de información del proyecto, entre otros).	100%	Se atendió la instalación del Comité de Contraloría Social, en el marco del cuarto trimestre de ejecución.
Elaborar el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero y enviar a instancia normativa.	100%	El presente documento cumple el procedimiento administrativo ante la Unidad de Asistencia e Integración Social y la Dirección General de Rehabilitación para realizar al 100 por ciento dicha meta.
Iniciar la instalación del tanque de hidroterapia.	100%	Se realizaron en tiempo y forma los trabajos preliminares para la instalación del Tanque de Hidroterapia.
Efectuar pagos y liberar recursos presupuestarios referentes al Proyecto.	100%	Se efectuaron pagos y se liberaron recursos conforme a la emisión de facturas del proveedor asignado.
Concluir la instalación del tanque.	100%	Se concluyó físicamente la instalación del Tanque Hidroterapéutico en el CREE Colima.
Beneficiar a 589 personas con discapacidad con servicios proporcionados por el área de hidroterapia, específicamente en el tanque hidroterapéutico.	100%	A partir de la conclusión de las obras e instalación del equipo de Tanque Hidroterapéutico, 589 personas con discapacidad se beneficiaron con los servicios proporcionados.
Realizar la comprobación del proyecto e integrar el Expediente Técnico acorde a los requerimientos de las Reglas de Operación del Programa y enviar al Sistema Nacional DIF los documentos que integran la comprobación (padrón de la población objetivo beneficiada, informes trimestrales de avance físico financiero, relación de gasto, informe	100	Se elaboró el Expediente técnico acorde a las Reglas de Operación del Programa, para envío a la Unidad de Asistencia e Integración Social y la Dirección General de Rehabilitación para realizar al 100 por ciento dicha meta.

final de resultados y bitácora fotográfica).		
---	--	--

Información de los Recursos Financieros Otorgados

Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Tanque Hidroterapéutico	\$3,750,000.00	\$1,500,000.00	FRP 284	Monto correspondiente al 40% de anticipo por concepto del Tanque Hidroterapéutico establecido en el contrato del proyecto. En referencia este número de factura, hubo cambio y actualización con la factura 21 anterior, debido a que la razón social del Sistema Estatal DIF Colima se encontraba erróneo.
Tanque Hidroterapéutico	\$3,750,000.00	\$2,250,000.00	FT 27	Monto correspondiente al 60% del restante del costo del proyecto.
Insumos para la operación de la Contraloría Social (Promoción y difusión de Contraloría Social del Programa de Atención a Personas con Discapacidad - trípticos y artículos promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas-)	\$20,000.00	16,820.00	F1318	-
Insumos para la operación de la Contraloría Social (Promoción y difusión de Contraloría Social del Programa de Atención a Personas con Discapacidad - trípticos y artículos promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas-)	\$20,000.00	3,180.00	F1321	-
Total	\$3,770,000.00	\$3,770,000.00		

Informe Gráfico de Avances

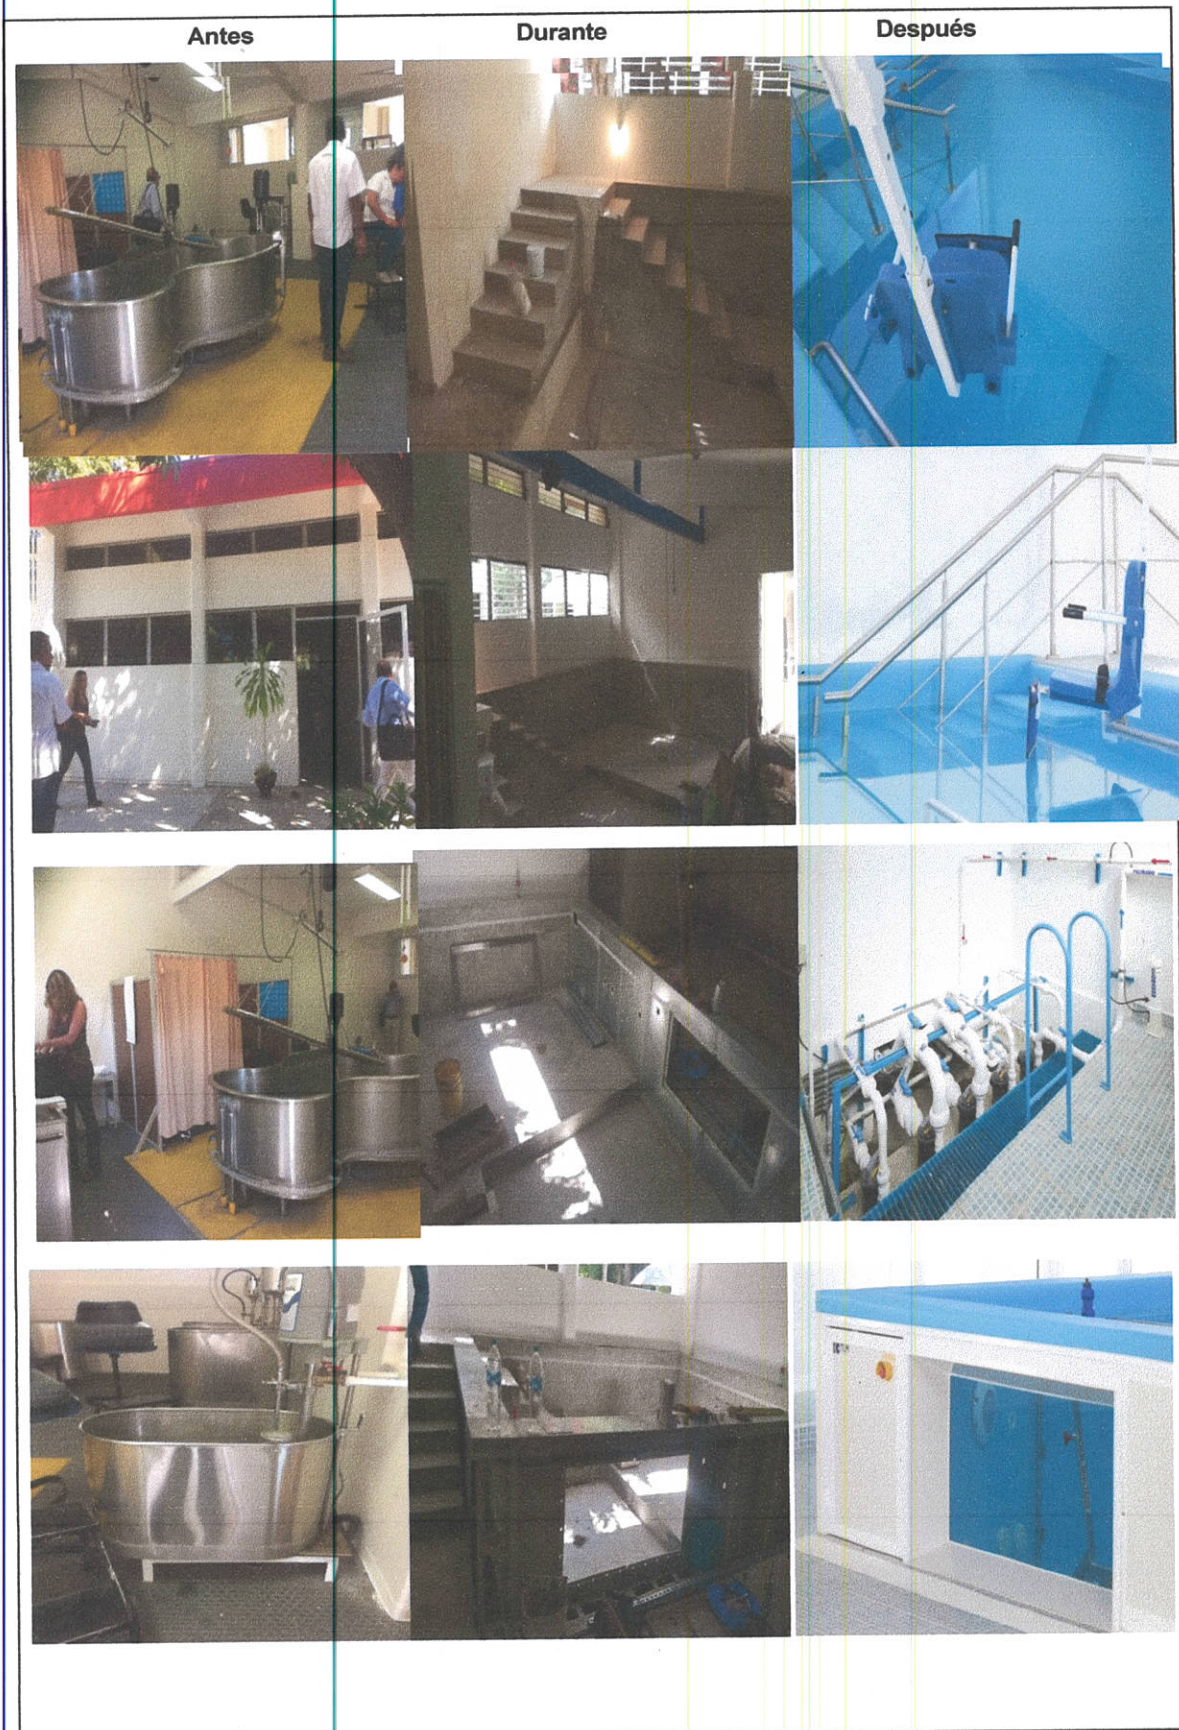


TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto, para la atención y beneficio de Personas con Discapacidad.



Lic. Marina Alfaro de Anda
Directora General del SEDIF Colima
