



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO – FINANCIERO

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
02 de octubre de 2023	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep X	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
24 de julio de 2023				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	
Nombre del(de la) Director (a) General	Licda. Rosa María Bayardo Cabrera	
Domicilio	Calle Encino número 530, Colonia Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima.	
Teléfono(s)	Correo(s) electrónico	Página Web y Redes Sociales
312 316 31 00 ext. 3109	difestatal.dirgen@gmail.com	http://www.difcolima.gob.mx

Nombre del Proyecto
Rehabilitación de Espacios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Colima

Objetivo del Proyecto
Fortalecer la infraestructura de los espacios que brindan servicios, mediante la rehabilitación de espacios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, C.R.E.E. Colima, con la finalidad de que las personas con discapacidad cuenten con condiciones de seguridad, comodidad, de la forma más natural y autónoma mediante la accesibilidad universal; en un entorno de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades y que permita mejorar las condiciones sociales e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para el ejercicio pleno de sus derechos.

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se elaboró el proyecto y se presentó para su valoración y aprobación ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) el 16 de mayo, a través de oficio 1472/2023, la UAIS envía oficio 260.000.00/487/2023 el 19 de mayo, notificando que el proyecto fue aprobado y continuarán las gestiones para la formalización del convenio y radicación de los recursos.

El Convenio de Coordinación se formalizó el día 05 de junio de 2023, para la posterior radicación del recurso el día 24 de julio de 2023 y la expedición del recibo correspondiente el 26 del mismo mes.

El día 04 de septiembre de 2023 se firmó Convenio de Coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Colima, para llevar a cabo el proceso administrativo para la contratación y ejecución de la obra.

De igual forma, una vez radicado el recurso, el día 28 de agosto de 2023 se realizó la gestión ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Colima (SEIDUM) para que se realice el procedimiento para la contratación de la obra contemplada en el Proyecto.

El día 07 de septiembre de 2023 se realizó una visita, en conjunto con SEIDUM, a las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial para la revisión del catálogo de conceptos.

Por lo anterior, no se logró concluir el procedimiento de licitación, ya que, de acuerdo al Convenio de Colaboración para la contratación y ejecución de la obra, la SEIDUM será la responsable una vez de la visita, elaborar el Catálogo de Conceptos, Estudio de Mercado, Presupuesto base, Programa de Obra y Proyecto con Especificaciones Técnicas y/o particulares a las acciones, mismo que en este trimestre se encuentra en proceso.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Presentación del proyecto.	100%	Se elaboró el proyecto y se presentó para su valoración y aprobación ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) el 16 de mayo, a través de oficio 1472/2023.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Aprobación del proyecto	100%	La UAIS envía oficio 260.000.00/487/2023 el 19 de mayo, notificando que el proyecto fue aprobado y continuarán las gestiones para la formalización del convenio y radicación de los recursos.
Formalización de convenio de coordinación.	100%	El Convenio de Coordinación entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima se formalizó el día 05 de junio de 2023.
Procedimiento administrativo para la obra (licitación).	20%	<p>Se formalizó Convenio de Colaboración para la contratación y ejecución de la obra entre la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Colima (SEIDUM) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.</p> <p>Una vez radicado el recurso, el día 28 de agosto de 2023, se envió el oficio No. 2741/2023 a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Colima (SEIDUM), para que se realice el procedimiento para la contratación de la obra contemplada en el Proyecto.</p> <p>En conjunto con SEIDUM, se realizó una visita, el día 07 de septiembre de 2023, a las instalaciones del Centro de</p>



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

		<p>Rehabilitación y Educación Especial para la revisión del catálogo de conceptos.</p> <p>Por lo anterior, no se logró concluir con el procedimiento de licitación, ya que, de acuerdo al Convenio de Colaboración para la contratación y ejecución de la obra, la SEIDUM será la responsable una vez de la visita, elaborar el Catálogo de Conceptos, Estudio de Mercado, Presupuesto base, Programa de Obra y Proyecto con Especificaciones Técnicas y/o particulares a las acciones, mismo que en este trimestre se encuentra en proceso.</p>
--	--	--

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Remodelación y mantenimiento de baños exteriores para usuarios Hombres				
Preliminares	\$18,950.00			
Albañilería	\$55,100.00			
Instalación Sanitaria	\$7,200.00			
Instalación Hidráulica	\$6,550.00			
Instalación Eléctrica	\$5,160.00			
Pisos y Azulejos	\$53,200.50			
Tablarroca y Durock	\$5,000.00			
Cancelería	\$40,000.00			
Muebles de Baño	\$27,000.00			

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Accesorios	\$23,850.00		
Pintura	\$8,330.00		
Remodelación y mantenimiento de baños exteriores para usuarios Mujeres			
Preliminares	\$24,760.00		
Albañilería	\$55,600.00		
Instalación Sanitaria	\$9,000.00		
Instalación Hidráulica	\$9,500.00		
Instalación Eléctrica	\$5,400.00		
Pisos y Azulejos	\$57,290.50		
Tablarroca y Durock	\$3,900.00		
Cancelería	\$40,000.00		
Muebles de Baño	\$29,500.00		
Accesorios	\$22,400.00		
Pintura	\$8,330.00		
Subtotal de Obra	\$516,021.00		
I.V.A.	\$82,563.36		
Total	\$598,584.36		

Informe Gráfico de Avances

Visita a las Instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial



Handwritten mark








El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

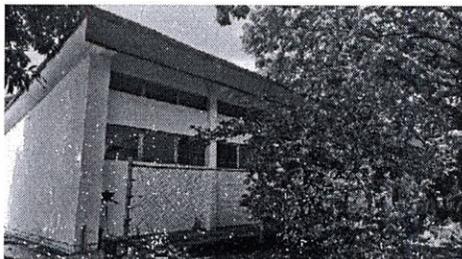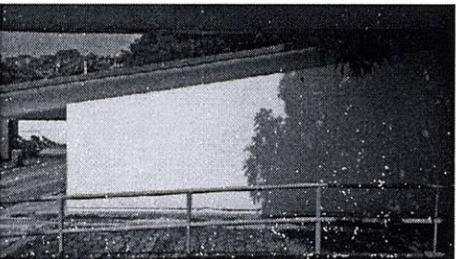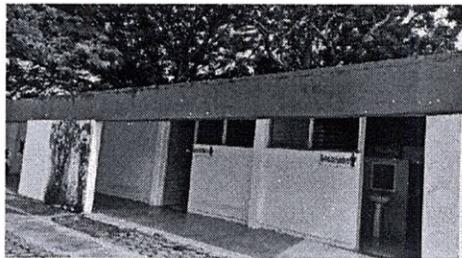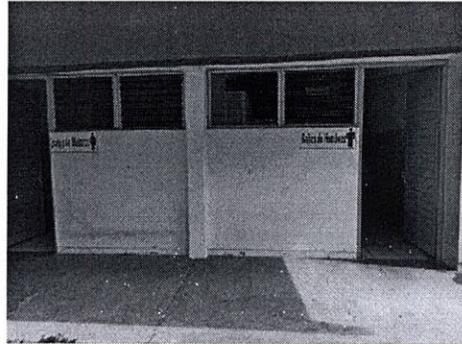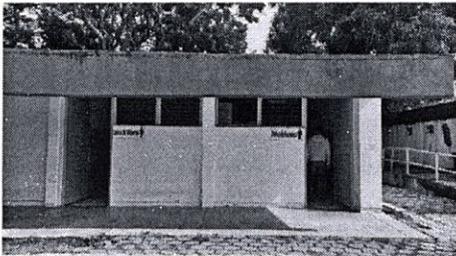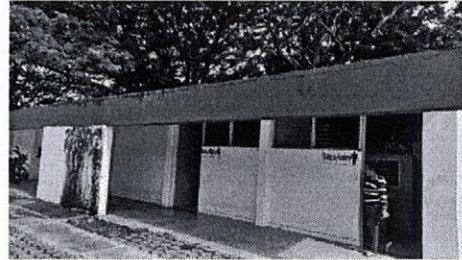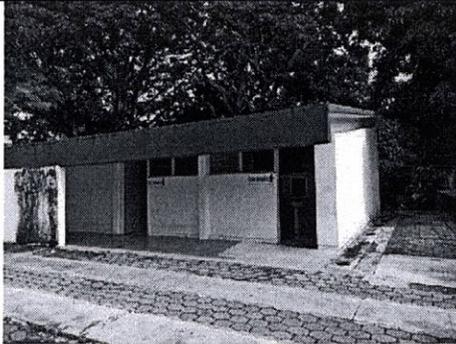

RE

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF

SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

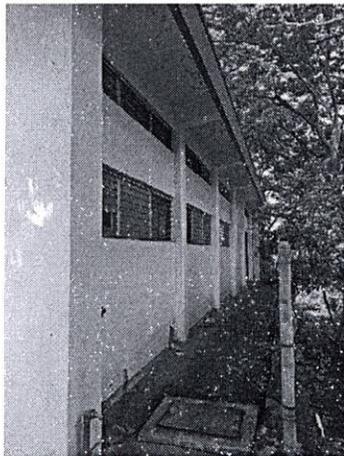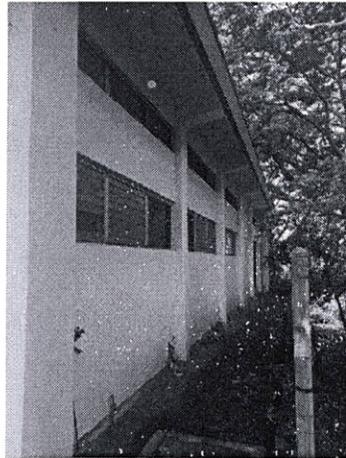

AL

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Baños exteriores para usuarios Hombres

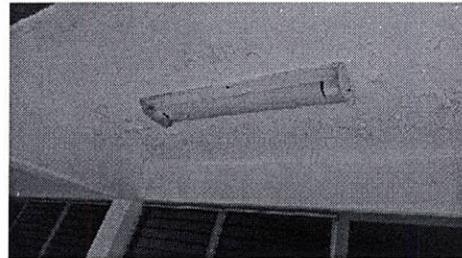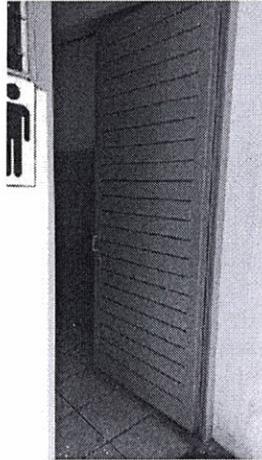




X



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

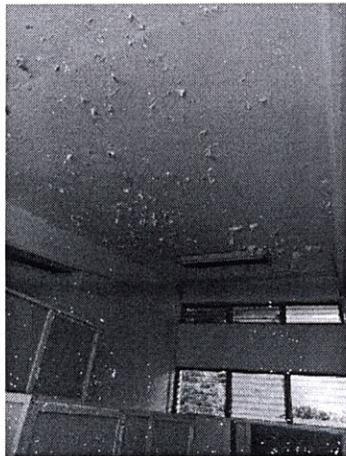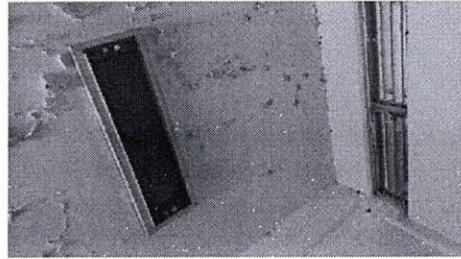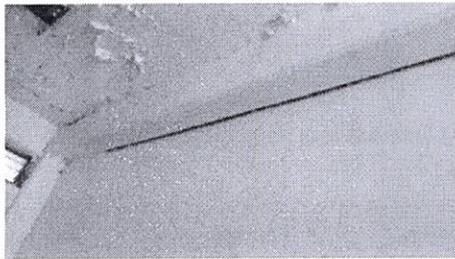

AL


El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

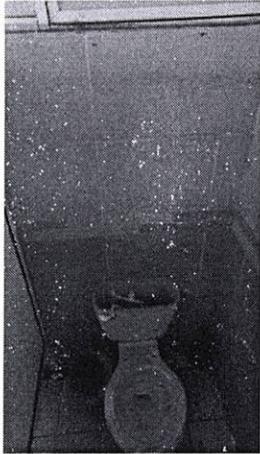

Handwritten signature or mark in red ink.





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Baños exteriores para usuarios Mujeres

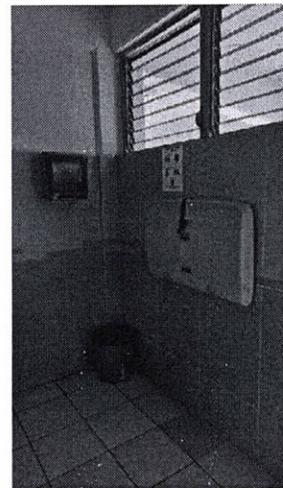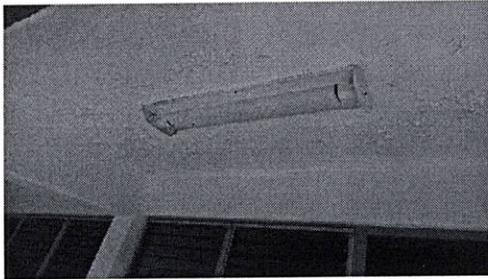

Handwritten red mark.


El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

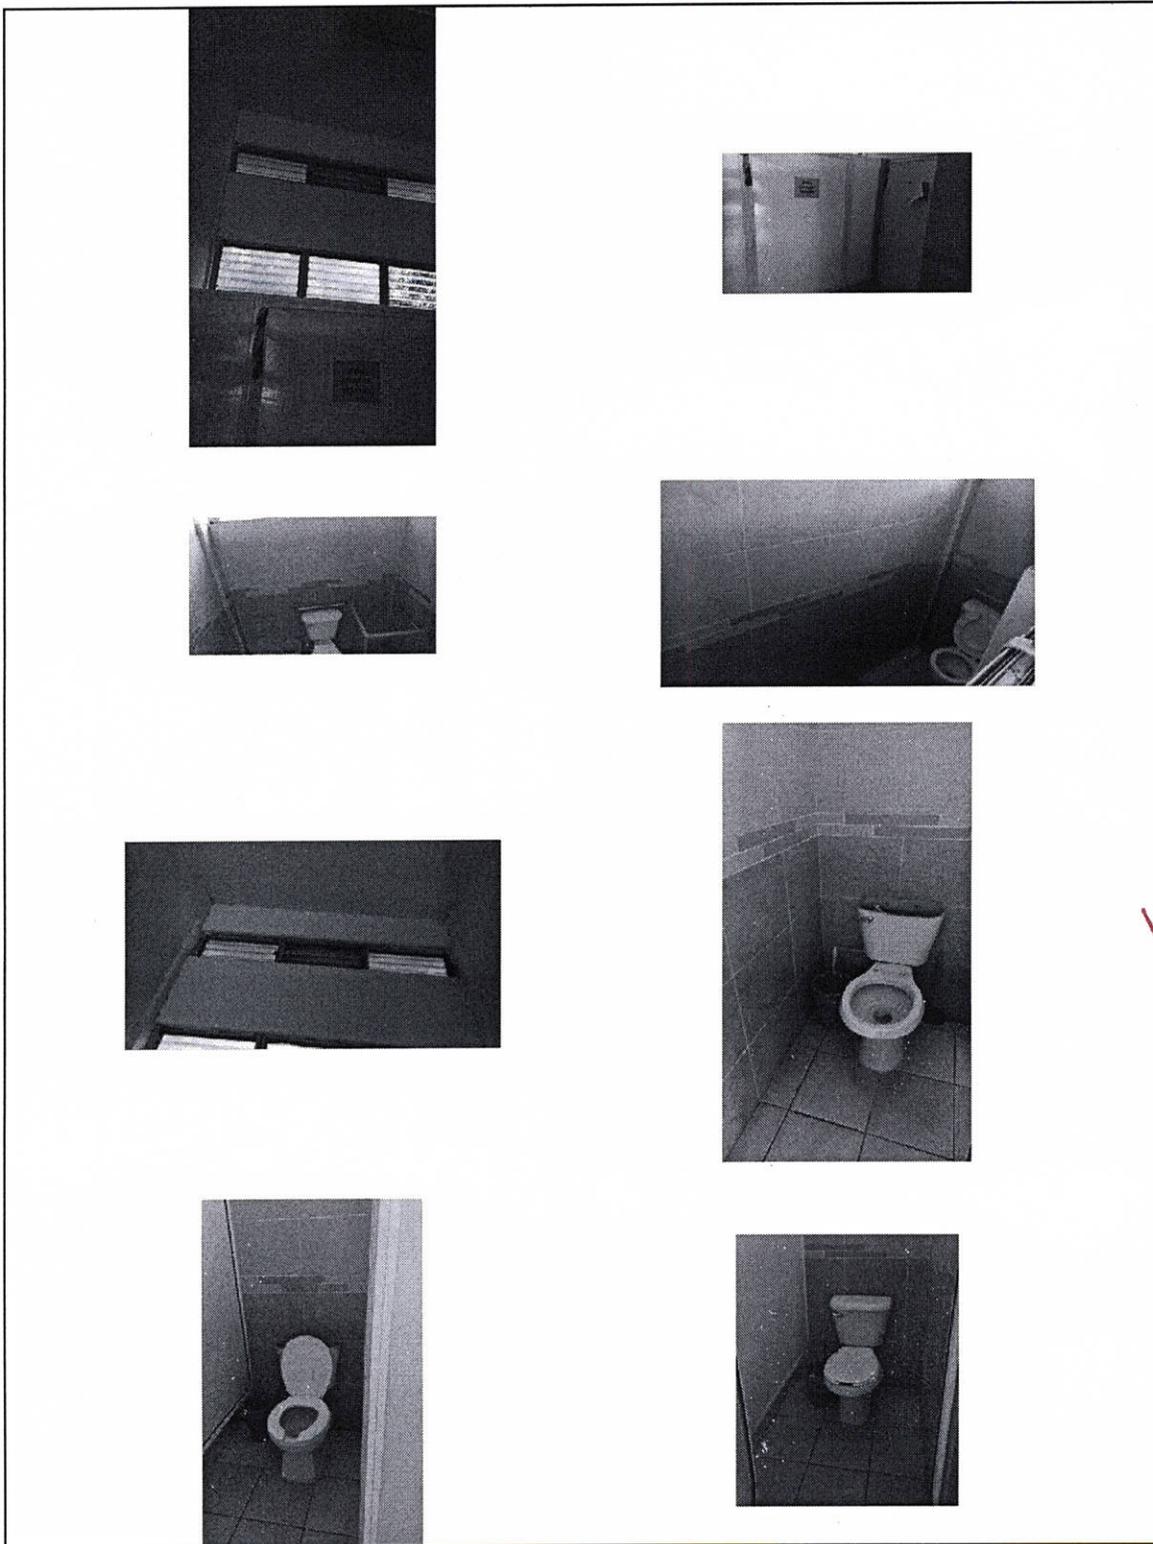

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

En el estado de Colima, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SEIDUM) tiene la facultad de "Planear, organizar, ejecutar, controlar y vigilar las obras públicas" en el estado, ante ello, y considerando la naturaleza del proyecto financiado por el Programa de Atención a Personas con Discapacidad durante el presente ejercicio fiscal, una vez que se confirmó la aprobación por parte del Sistema Nacional DIF, el Sistema Estatal DIF comenzó las gestiones para la firma de un convenio de colaboración en el que la SEIDUM se compromete a elaborar el proyecto ejecutivo (planos, catálogo de conceptos, presupuesto base e investigación de mercado), así como del procedimiento de contratación, ejecución y supervisión de la rehabilitación de espacios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Una vez radicado el recurso, el SEDIF envió oficio a SEIDUM, indicando que contamos con la suficiencia presupuestal necesaria para la ejecución del proyecto, y solicitando atender a sus compromisos relativos al inicio de operaciones. En respuesta a este oficio, representantes de ambas instituciones realizamos una visita al CREE para tener elementos suficientes para elaborar el proyecto ejecutivo; sin embargo, hasta el cierre del tercer trimestre, la SEIDUM no ha remitido dicha propuesta al Sistema Estatal DIF, motivo por el cual se ha presentado un retraso en el inicio del proceso administrativo contemplado en el presente proyecto.

Licda. Rosa María Bayardo Cabrera

Directora General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Colima
