

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

INFORME DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marcar con X)			
05 de Octubre del 2017	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep X	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
19 de Mayo 2017				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima	
Nombre del Director General o Apoderado legal	Dra. Mayren Polanco Gaytán	
Domicilio	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(01) 312 3163 100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/

adm

Nombre del Proyecto
Adquisición e Instalación de Un Tanque Hidroterapéutico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Estatal Colima

Objetivo del Proyecto

Contribuir a mejorar la calidad y bienestar de vida de las personas con discapacidad y generar espacios nuevos, adecuados y habilitados dentro del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal Colima, mediante la adquisición e instalación de un tanque hidroterapéutico donde se beneficiará, principalmente, a personas en el estado de Colima identificadas con algún tipo de discapacidad; con el fin de coadyuvar a la autosuficiencia, desarrollo e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad en el Estado y promover que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se realizaron los trámites administrativos correspondientes ante la Unidad de Asistencia e Integración Social para la presentación y aprobación del proyecto, mediante el cual se pretende beneficiar a 589 personas a través de la adquisición e instalación de un tanque hidroterapéutico dentro del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Estatal Colima. Así se protocolizó y firmó del Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidio, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Se efectuó el proceso de la Licitación Pública Nacional con Número LA-906022993-E1-2017, para la adquisición e instalación del Tanque Hidroterapéutico en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Colima (Código del Expediente 1430446) llevada a cargo por el DIF Estatal Colima; donde a partir del 01 de septiembre se comenzó con la Junta de Aclaración de las Bases de Licitación, el día 04 de Septiembre se realizó el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, y se llevó a cabo un diferimiento para ejecutar el fallo de la licitación el 12 de Septiembre. En este sentido, se comenzó el trámite y proceso administrativo para la emisión del contrato y consecuentemente de las facturas con el proveedor asignado. De forma paralela, el proveedor comenzó con los trabajos preliminares en el área de Hidroterapia donde se instalará el Tanque Hidroterapéutico.

qdkm

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas

Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
- Elaborar el Proyecto y presentar a la Unidad de Asistencia e Integración Social (UAIS) del SNDIF para su valoración y aprobación. - Firmar el convenio de Colaboración	100%	Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Integración Social, así como en la Dirección General de Rehabilitación, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación para la aprobación del

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

2

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días naturales posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

con instancia normativa y el DIF Estatal de Colima.	100%	proyecto, elaboración del convenio y la radicación de los recursos federales.
• Apertura de una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del Programa.	100%	
• Realizar al procedimiento administrativo para adquirir e instalar el tanque hidroterapéutico (licitación).	100%	Se realizaron los procedimientos para la Licitación Pública Nacional con Número LA-906022993-E1-2017
• Realizar las actividades de la Contraloría Social (conformar los Comités de la Contraloría Social pertinentes, colocar los letreros de Contraloría Social con la totalidad de información del proyecto, entre otros).	0%	Se tiene elaborado el Programa de Actividades y se tiene pendiente de recibir la clave de acceso al Sistema Informático de Contraloría Social para ingresar la programación de actividades y comenzar con las mismas.
• Elaborar el Informe Trimestral de Avance Físico-Financiero y enviar a instancia normativa.	100%	El presente documento cumple el procedimiento administrativo ante la Unidad de Asistencia e Integración Social y la Dirección General de Rehabilitación para realizar al 100 por ciento dicha meta.
• Iniciar la instalación del tanque de hidroterapia.	100%	Se iniciaron los trabajos preliminares para la instalación del Tanque de Hidroterapia (Ver Informe Gráfico de Avances).
• Efectuar pagos y liberar recursos presupuestarios referentes al Proyecto.	50%	A partir de la conclusión del proceso de licitación, se realizaron los trabajos administrativos para emitir el contrato del proyecto al proveedor resultante en el fallo de la misma.

ojfm

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Tanque Hidroterapéutico	\$3,750,000.00	\$1,500,000.00	21	Monto correspondiente al 40% de anticipo por concepto del Tanque Hidroterapéutico establecido en el contrato del proyecto.
Insumos para la operación de la Contraloría Social (Promoción y difusión de Contraloría Social del Programa de Atención a Personas con Discapacidad - trípticos y artículos promocionales: lápices, reglas, ánforas y libretas-)	\$20,000.00	-	-	-
Total	\$3,770,000.00	\$1,500,000.00		


apto

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"


El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días naturales posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Informe Gráfico de Avances

Antes

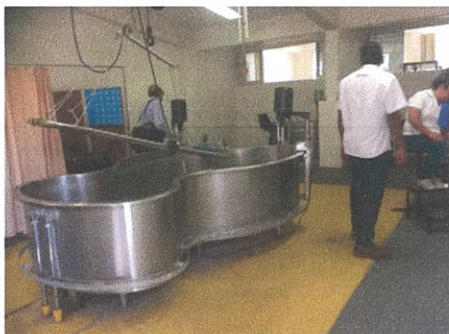

Después



5/1/16

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días naturales posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Al presente informe, se anexa la documentación correspondiente a la Licitación Pública Nacional con Número LA-906022993-E1-2017, para la adquisición e instalación del Tanque Hidroterapéutico; misma documentación se encuentra disponible en la plataforma <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>.

Se emitió la primera factura con fecha del 29 de Septiembre del presente ejercicio fiscal, como anticipo del 40% para la Adquisición e Instalación del Tanque Hidroterapéutico, se anexa factura No. 21.


Dra. en C. Mayren Polanco Gaytán
Directora General del SEDIF Colima
